



Характеристика проектной компании, открытой к инновациям:

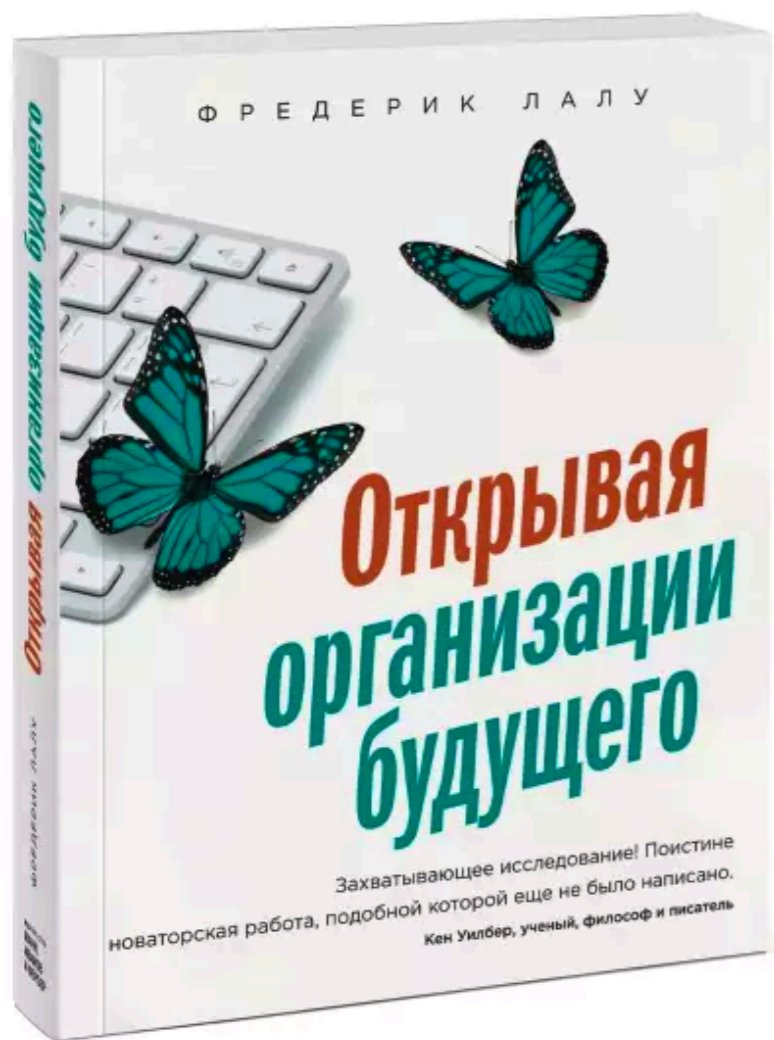


- настроена процессная работа;
- проектирование организовано как виртуальное производство;
- присутствует система качества продукта;
- прозрачная деятельность во всем предприятии, все видят всех;
- минимум совещаний;
- машина помогает управлять компанией.

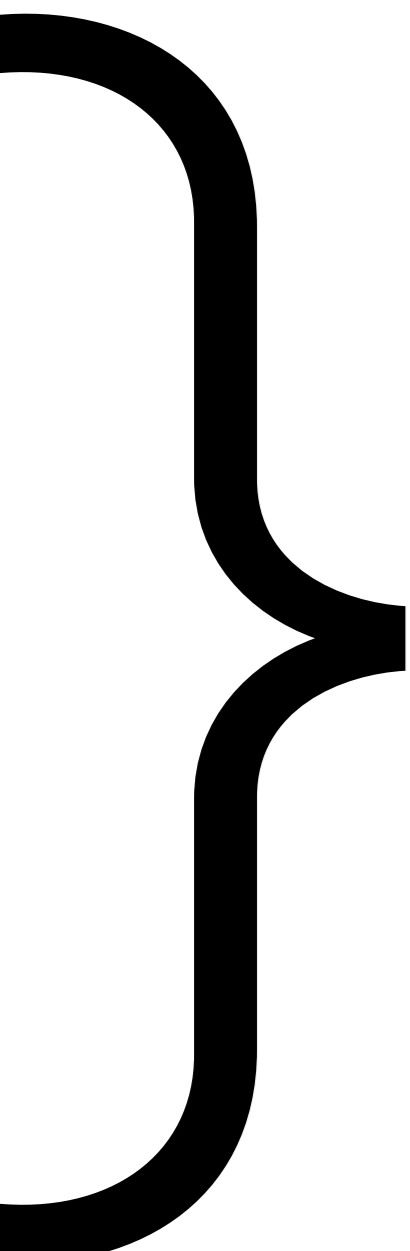

— Что может машина?

— Загрузка компании

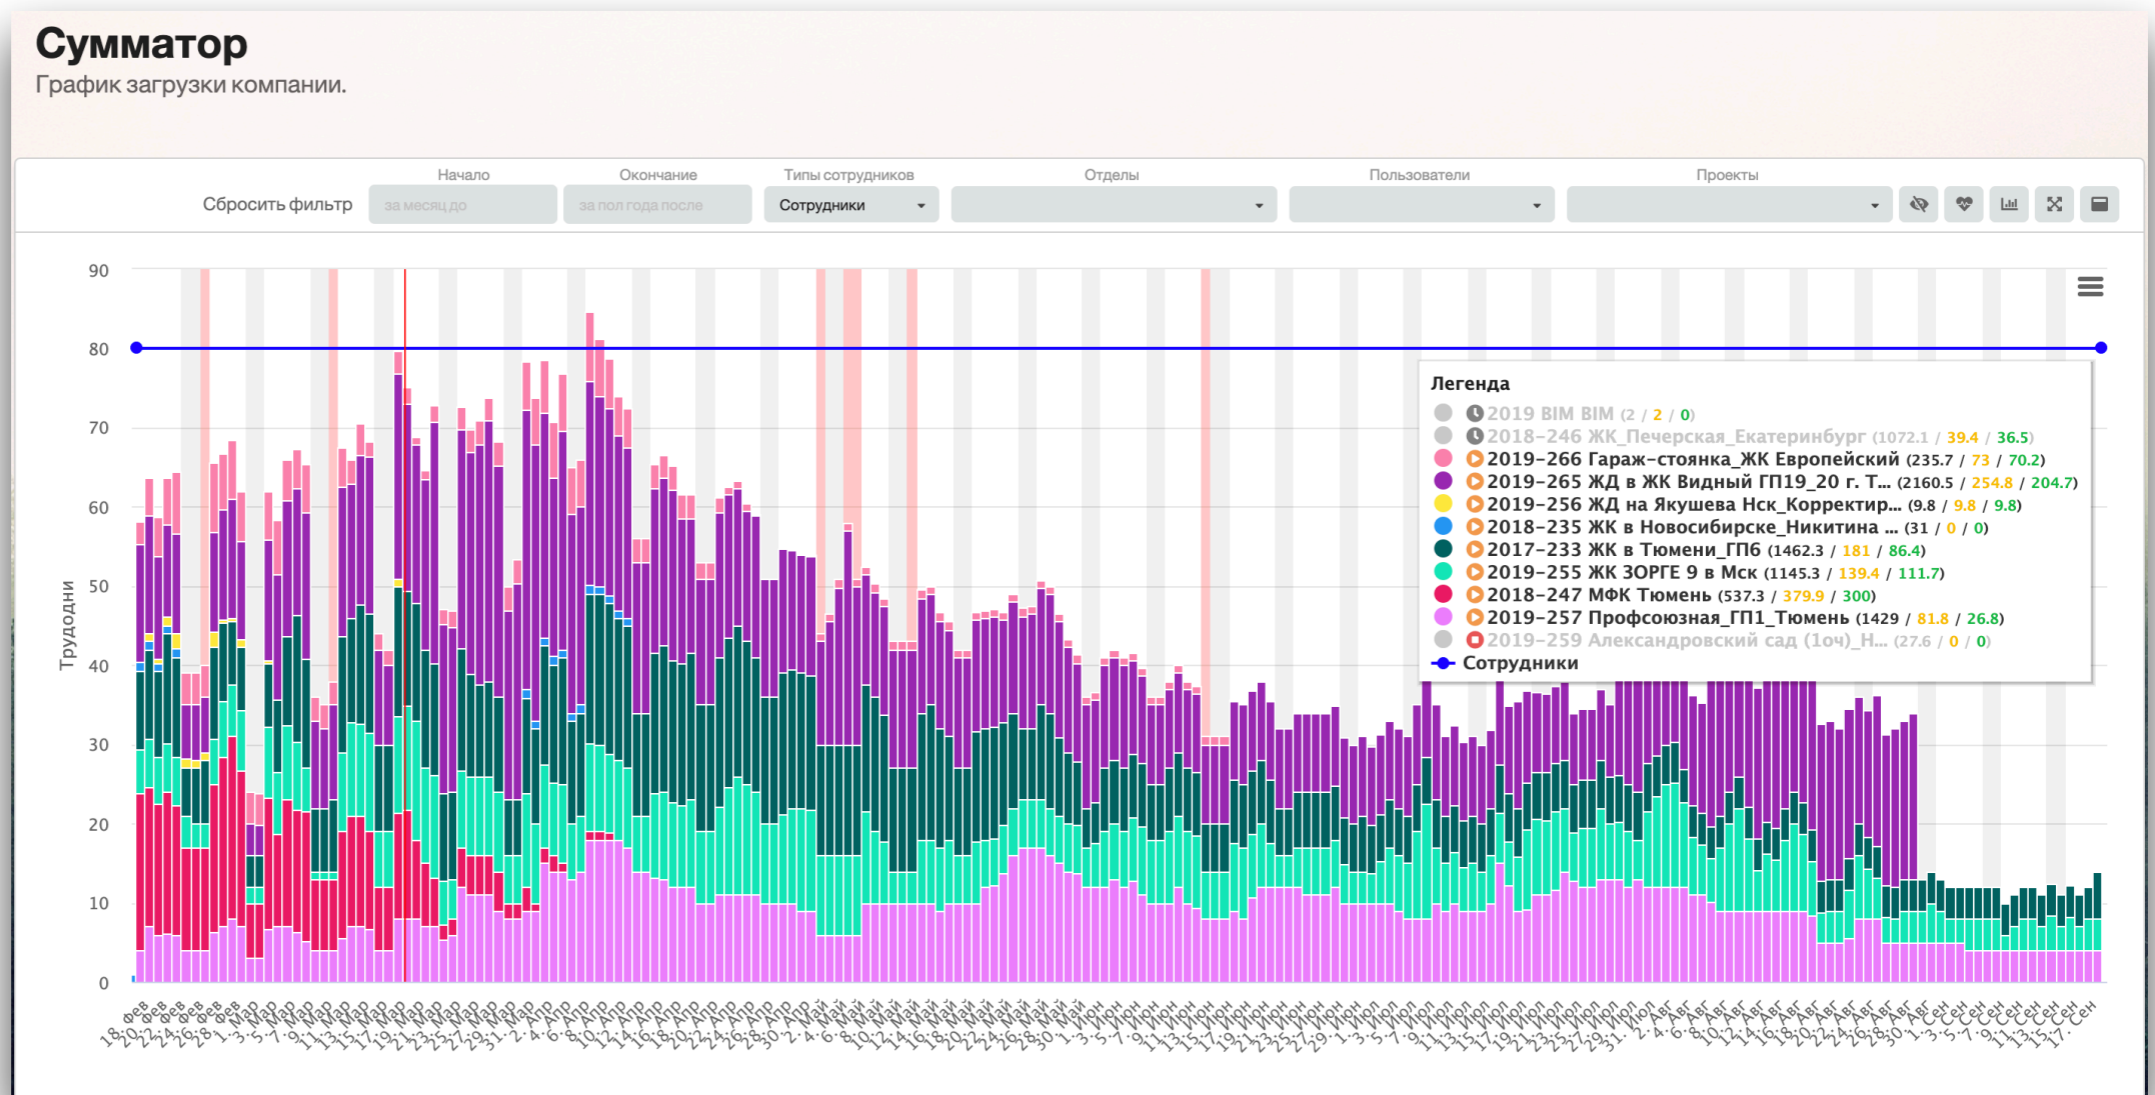

Примечания:

сумматор может отображать проверенные, выполненные задачи во всем объёме загрузки компании.

— Монитор проектов компании

Проекты ждуну


Рейтинг проектов по просроченным трудозатратам.

#	Проект	Статус	РП	З/В/П, тр.д.	Процент СП, %	Просрочено, дней/тр.д.	Просрочено, %	Текущий лг. руб./тр.д. x 10 ³
1	2019-266 Гараж-стоянка_ЖК Европейский	Выполнение	Кузьмина А. В.	385.3 / 217.0 / 214.3	100%	37 / 48.8	12.7	16.4
2	2018-235 ЖК в Новосибирске_Никитина 1 о...	Выполнение	Михайлин С. П.	905.1 / 776.1 / 776.1	2%	52 / 109.0	12.0	8.9
3	2017-233 ЖК в Тюмени_ГП6	Выполнение	Петрушкевич Р. С.	4296.3 / 2337.0 / 2098.6	14%	101 / 515.2	12.0	7.7
4	2018-247 МФК Тюмень	Выполнение	Петрушкевич Р. С.	2579.3 / 2403.9 / 2263.2	0%	86 / 183.6	7.1	7.1
5	2019-257 Профсоюзная_ГП1_Тюмень	Выполнение	Михайлин С. П.	2574.4 / 998.1 / 921.6	14%	100 / 116.3	4.5	4.7
6	2019-255 ЖК ЗОРГЕ 9 в Мск	Выполнение	Михайлин С. П.	3509.2 / 1952.6 / 1889.3	23%	58 / 130.9	3.7	7.1
7	2019-265 ЖД в ЖК Видный_ГП19_20 г. Тюме...	Выполнение	Кузьмина А. В.	3353.7 / 1358.1 / 1313.6	33%	95 / 97.5	2.9	4.1
8	2019-256 ЖД на Якушева Нск_Корректировк...	Выполнение	Петрушкевич Р. С.	517.7 / 516.7 / 516.7	2%	0 / 0	0	5.2

Примечания:

отчёт сортирует проекты по объёму просроченных задач.


— Анализ план-факта по проектам компании

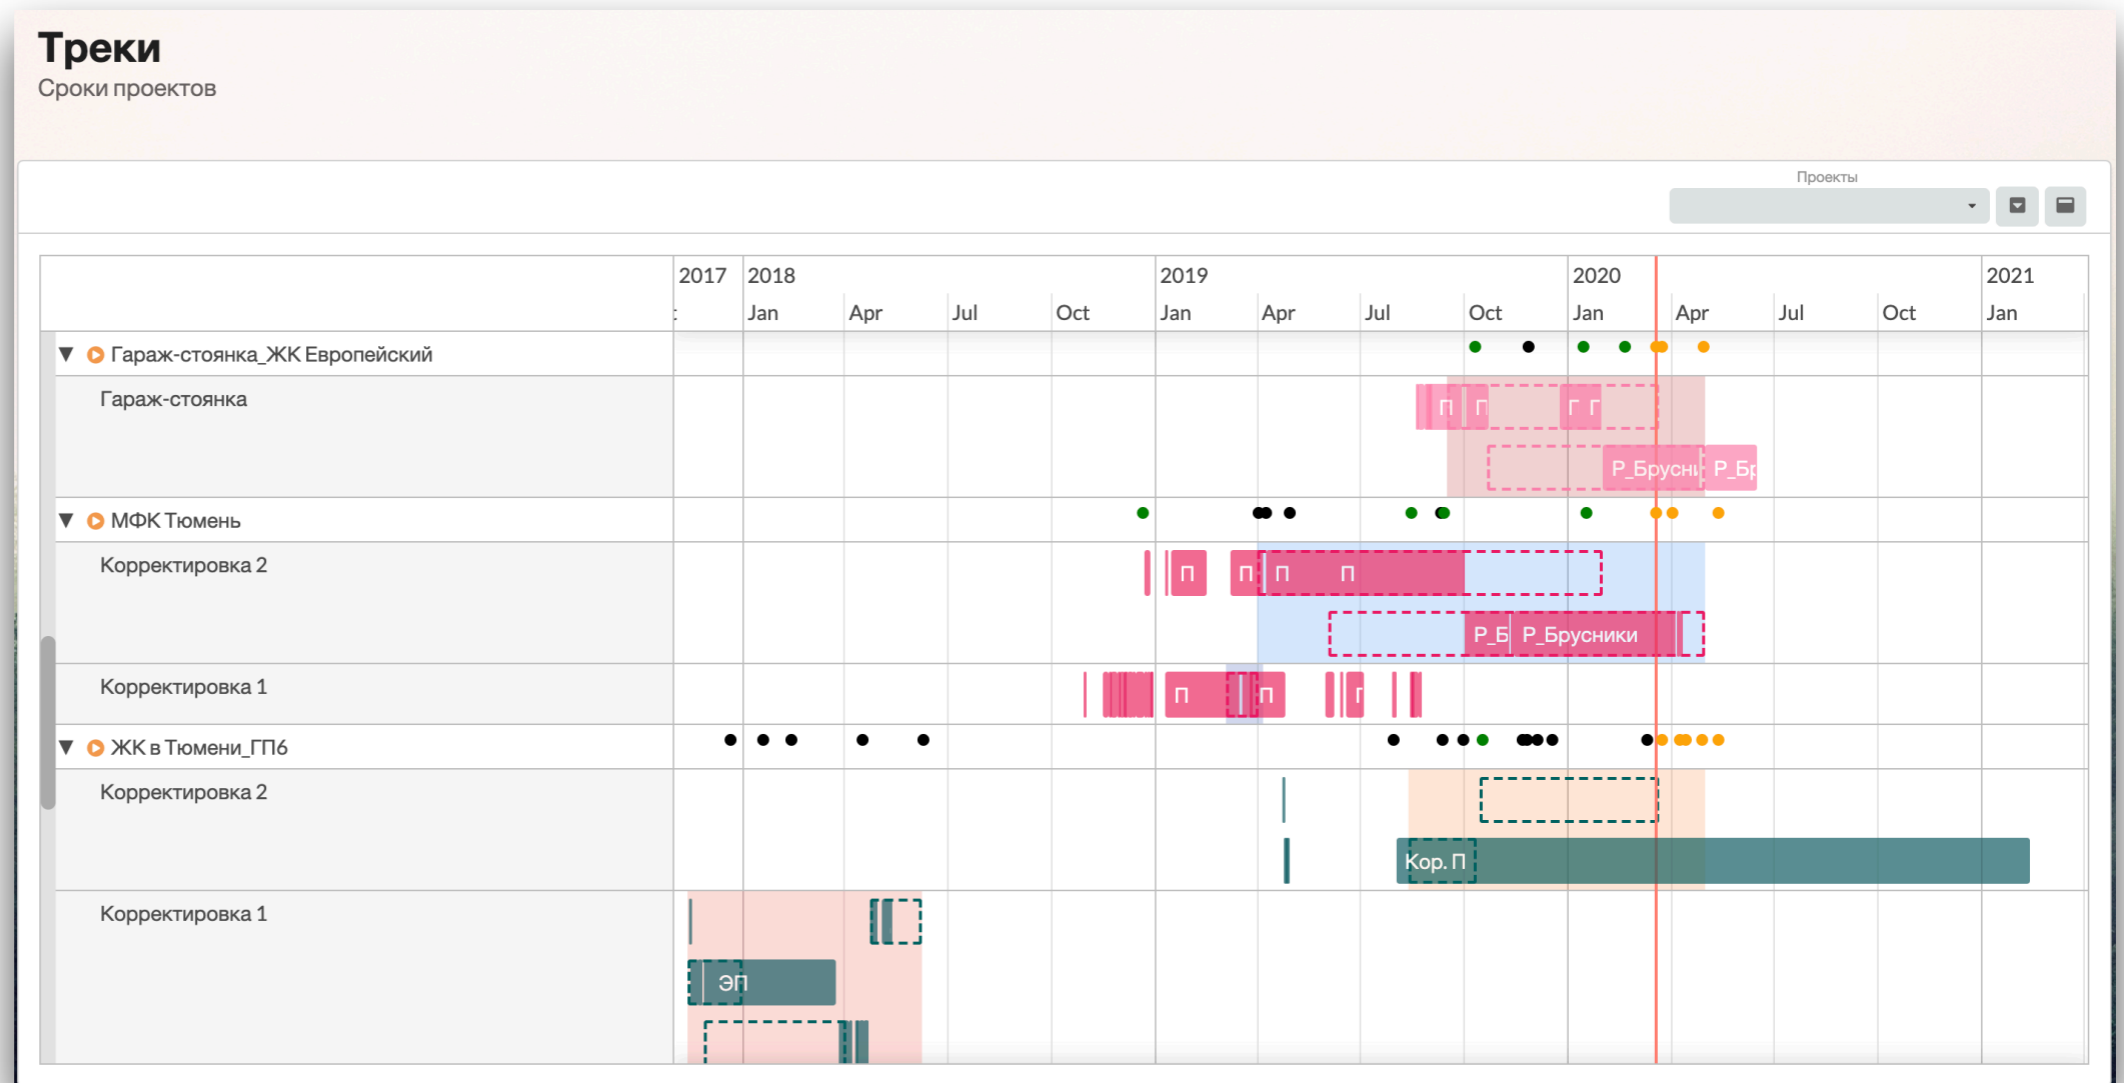

Примечания:

показывает плановые и фактические трудозатраты;
показывает грядущие, полученные и заактивированные
платежи по проектам.

— Доска почёта компании

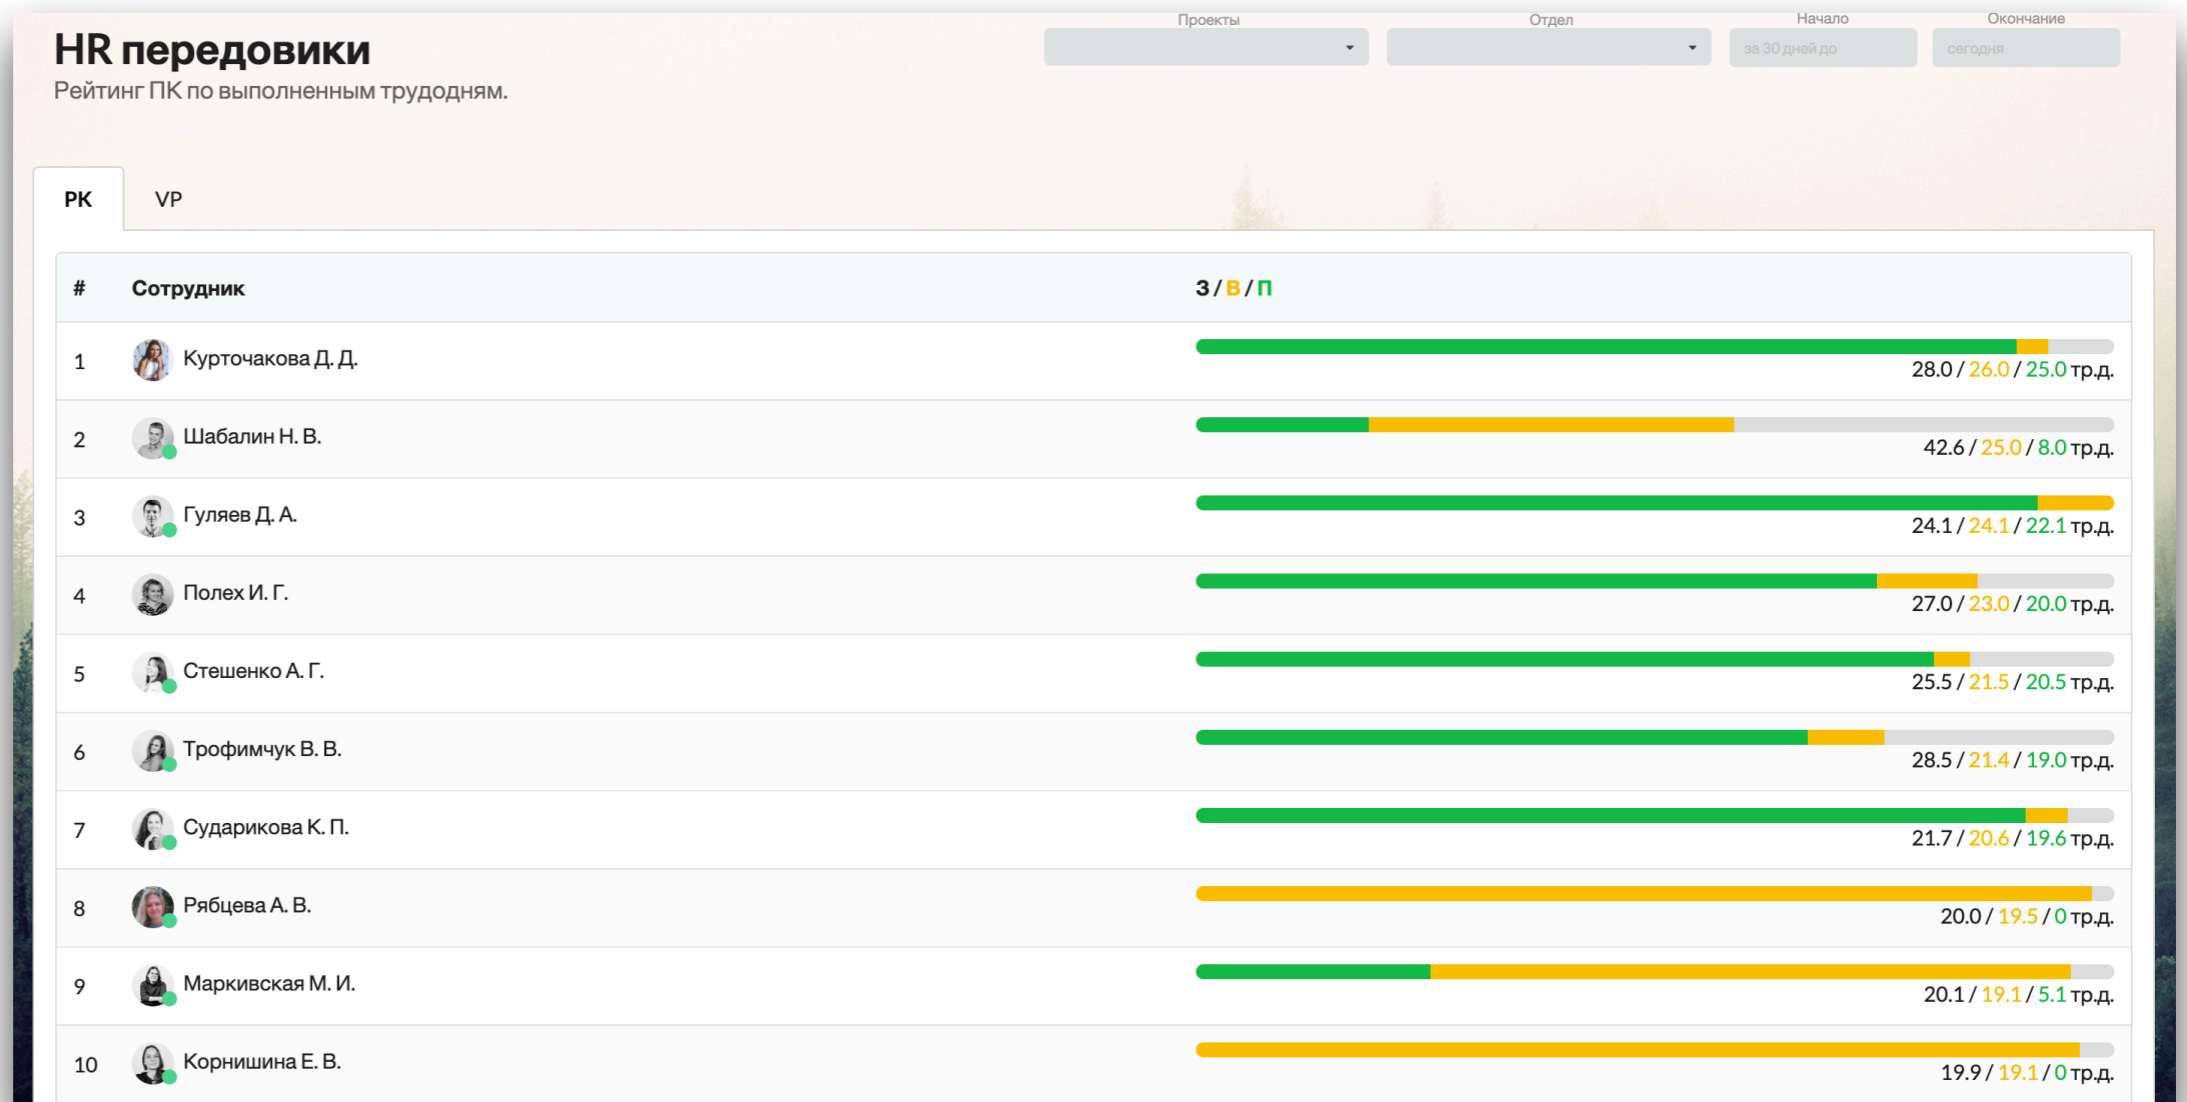





















— Доска позора компании

HR отстающие
Рейтинг ПК по просроченным трудов дням.

Проекты Отдел Начало за 30 дней до Окончание сегодня

РК VP

#	Сотрудник	З/В/П	Просрочено
1	 Малушина В. О.		44.0 / 15.3 / 2.3 тр.д. 35.8 тр.д.
2	 Неизвестно		40.0 / 2.0 / 2.0 тр.д. 34.0 тр.д.
3	 Козлов И. О.		37.0 / 17.3 / 3.8 тр.д. 31.1 тр.д.
4	 Шабалин Н. В.		42.6 / 25.0 / 8.0 тр.д. 29.6 тр.д.
5	 Вебер М. Я.		45.0 / 2.0 / 2.0 тр.д. 28.8 тр.д.
6	 Генкель О. И.		20.0 / 17.5 / 0 тр.д. 19.0 тр.д.
7	 Рябцева А. В.		20.0 / 19.5 / 0 тр.д. 18.0 тр.д.
8	 Горкольцева А. С.		20.5 / 9.0 / 0 тр.д. 17.9 тр.д.
9	 Пестунова А. А.		19.9 / 14.9 / 0 тр.д. 17.9 тр.д.
10	 Корнишина Е. В.		19.9 / 19.1 / 0 тр.д. 17.6 тр.д.

— Срочные проблемы в компании


Задачи ждуют

Сотня самых просроченных задач в компании.

Проекты

#	Задача	Проект	З / В / П	Просрочено	Исполнитель	Ведущий
1	Оформление кладочных планов	2017-233	2.0 / 2.0 / 0 тр.д.	102 д. / 2.0 тр.д.	Косьянова Л. А.	Воронина Е. С.
2	Подготовка видов и листов для фрагментов кладки	2019-257	2.0 / 2.0 / 0 тр.д.	101 д. / 2.0 тр.д.	Буренова Т. В.	Попова А. А.
3	Разрезы	2017-233	2.5 / 2.5 / 0 тр.д.	98 д. / 2.5 тр.д.	Косьянова Л. А.	Воронина Е. С.
4	Моделирование кровли	2017-233	0.5 / 0.5 / 0 тр.д.	97 д. / 0.5 тр.д.	Косьянова Л. А.	Воронина Е. С.
5	Схема разметки парковки	2017-233	0.5 / 0.5 / 0 тр.д.	97 д. / 0.5 тр.д.	Косьянова Л. А.	Воронина Е. С.
6	Оформление и разработка эскизов схем Витражей	2017-233	2.0 / 2.0 / 0 тр.д.	97 д. / 2.0 тр.д.	Рябцева А. В.	Воронина Е. С.
7	Оформление фрагментов кладки и армирования наружны...	2019-257	2.0 / 2.0 / 0 тр.д.	97 д. / 2.0 тр.д.	Буренова Т. В.	Попова А. А.
8	Создание спецификации по дверям	2017-233	1.0 / 1.0 / 0 тр.д.	96 д. / 1.0 тр.д.	Рябцева А. В.	Воронина Е. С.
9	Добавление расширяющего профиля в семейство BRU_Ок...	2019-265	1.0 / 0 / 0 тр.д.	96 д. / 1.0 тр.д.	Воронов В. В.	Фёдорова Е. В.
10	Подвальный этаж : Корректировка семейств BRUОкона	2017-233	0.5 / 0.5 / 0 тр.д.	95 д. / 0.5 тр.д.	Рябцева А. В.	Воронина Е. С.
11	Проверка типово дверей на соответствие исходным да...	2019-257	4.0 / 4.0 / 0 тр.д.	95 д. / 4.0 тр.д.	Скрипникова О. С.	Попова А. А.


— Успешаемость по проекту

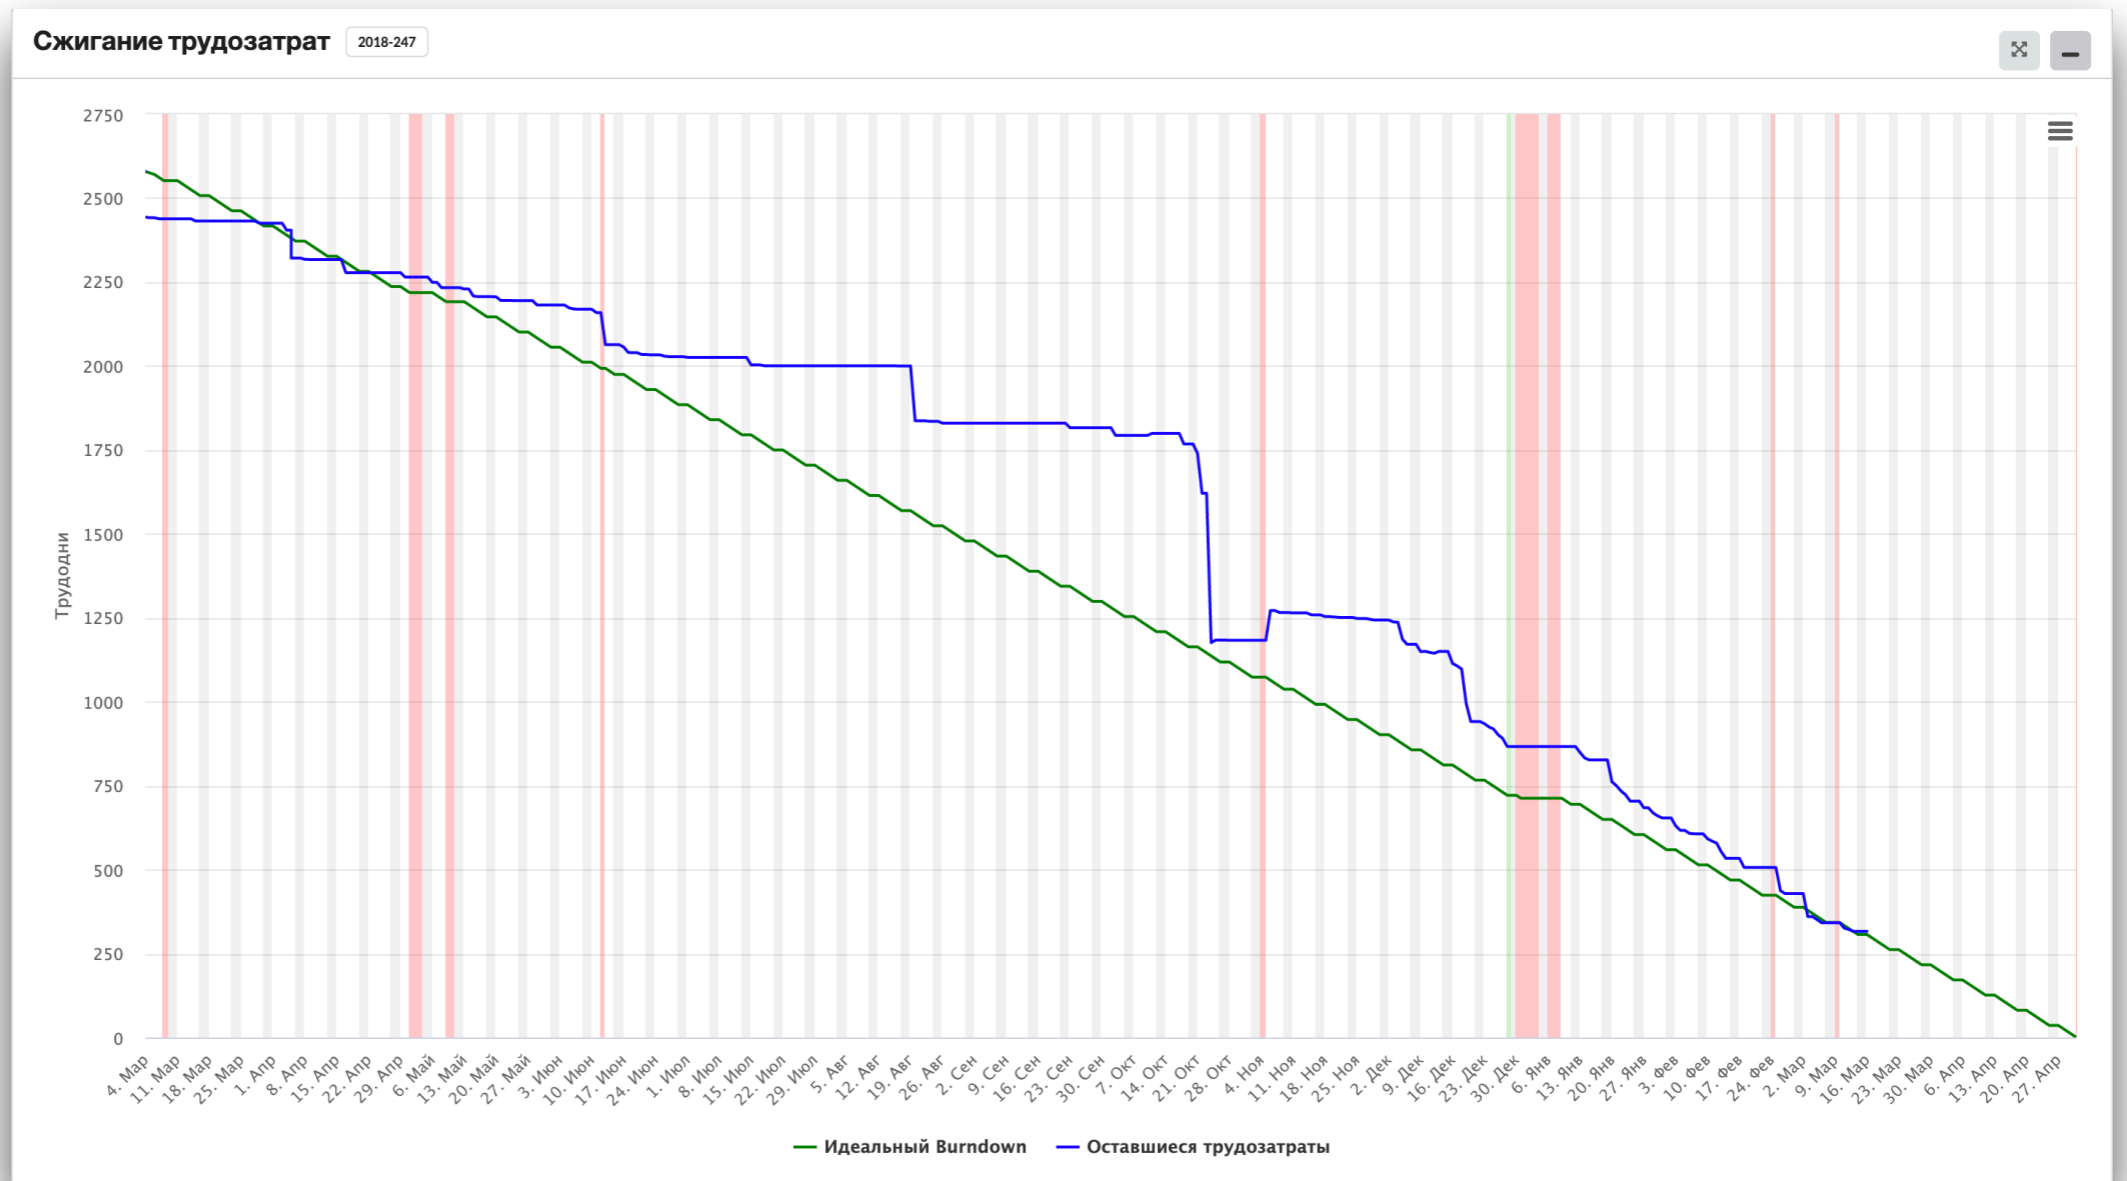

Примечания:


машина сама понимает динамику сжигания трудозатрат, исходя из объёма и времени проекта.

— Анализ изменений в проекте

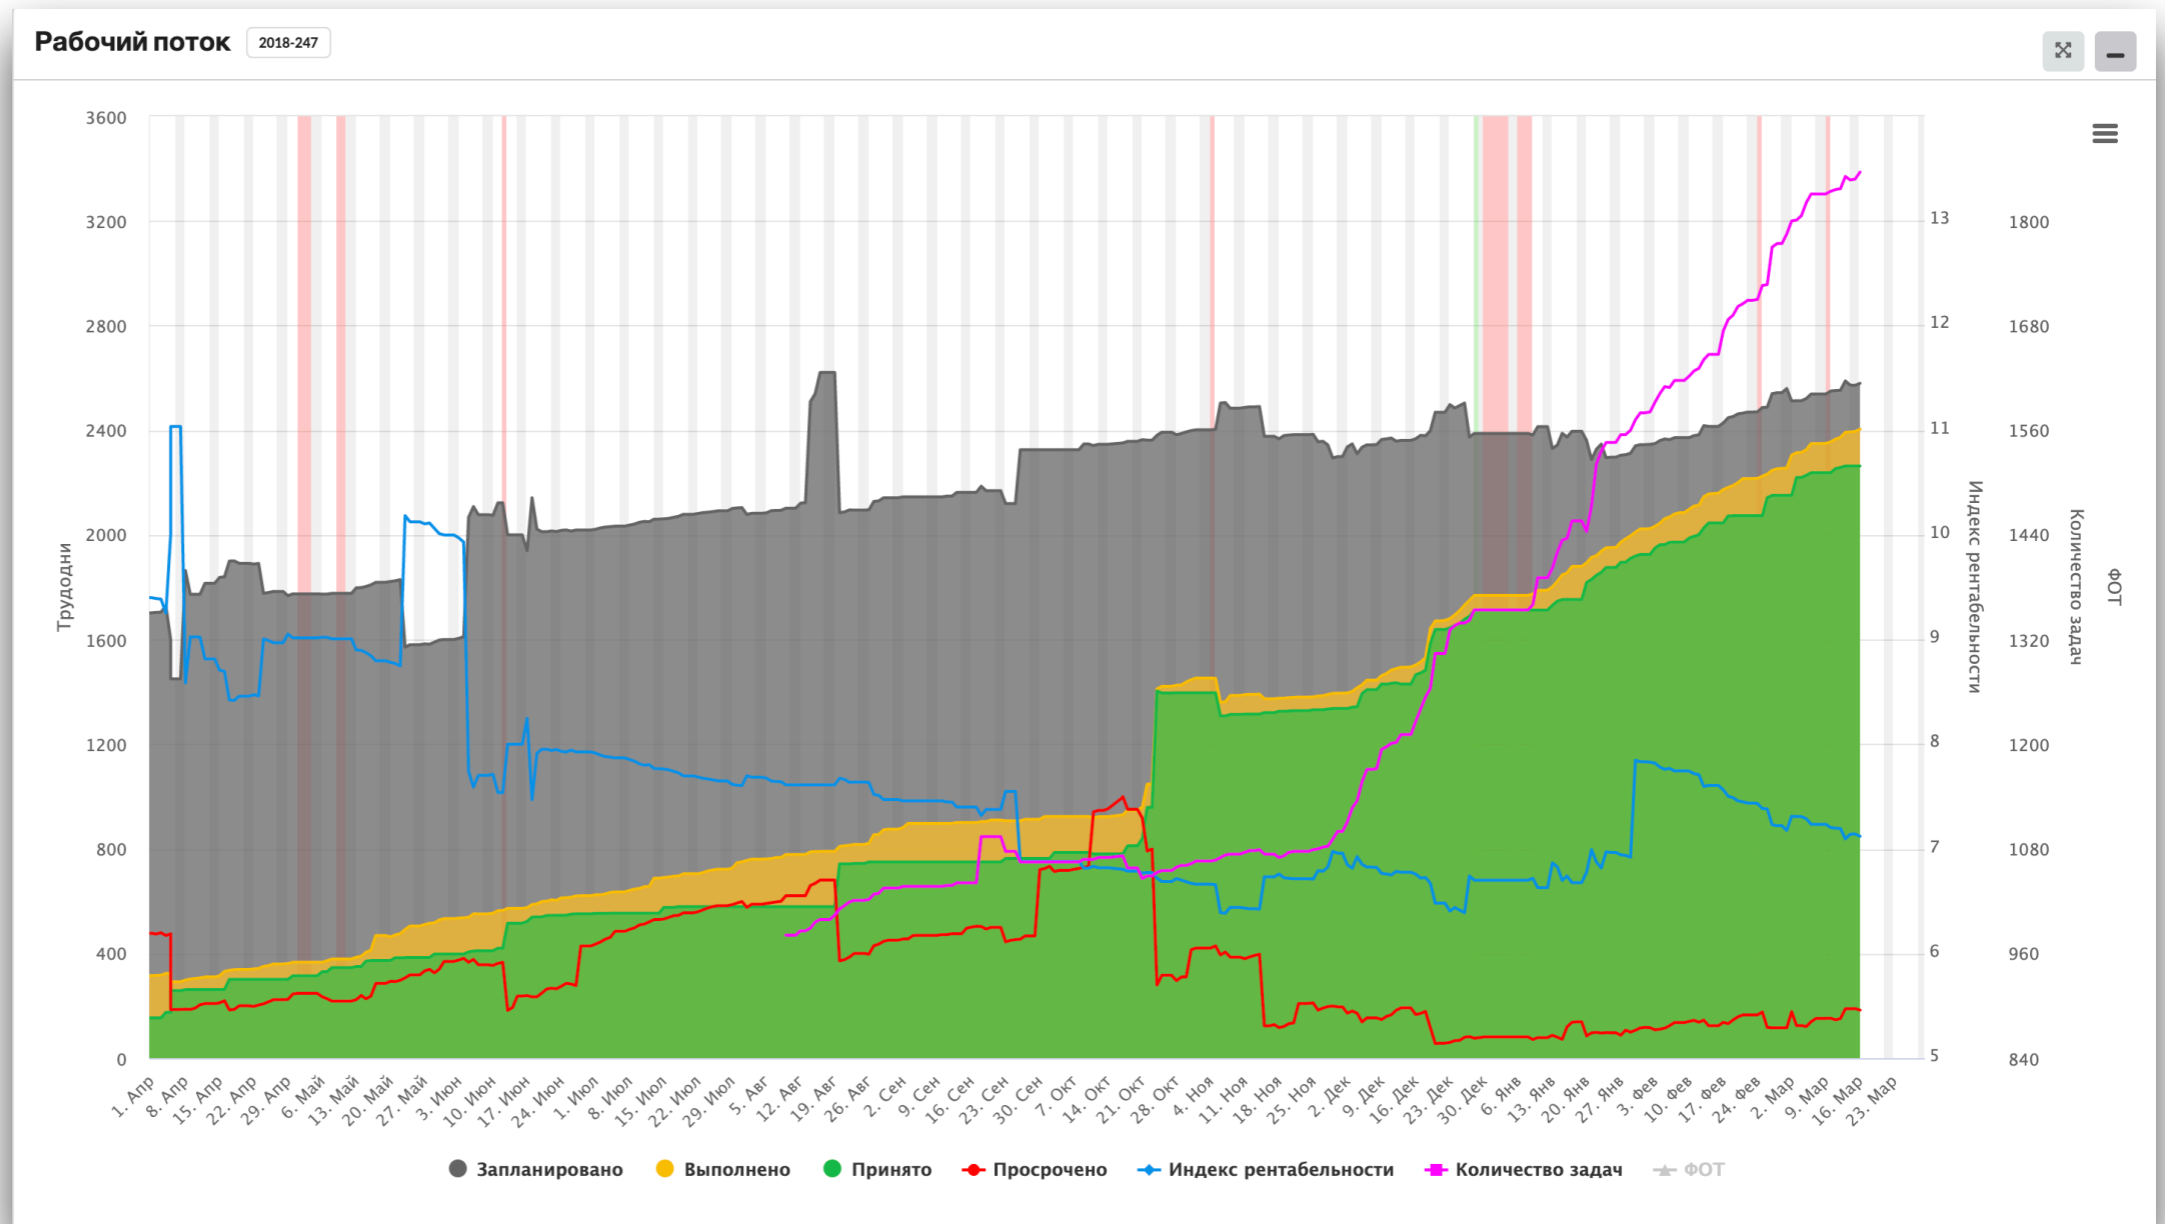

Примечания:
машина автоматически, в режиме реального времени,
корректирует индекс рентабельности проекта.


– Поиск проблем в проекте

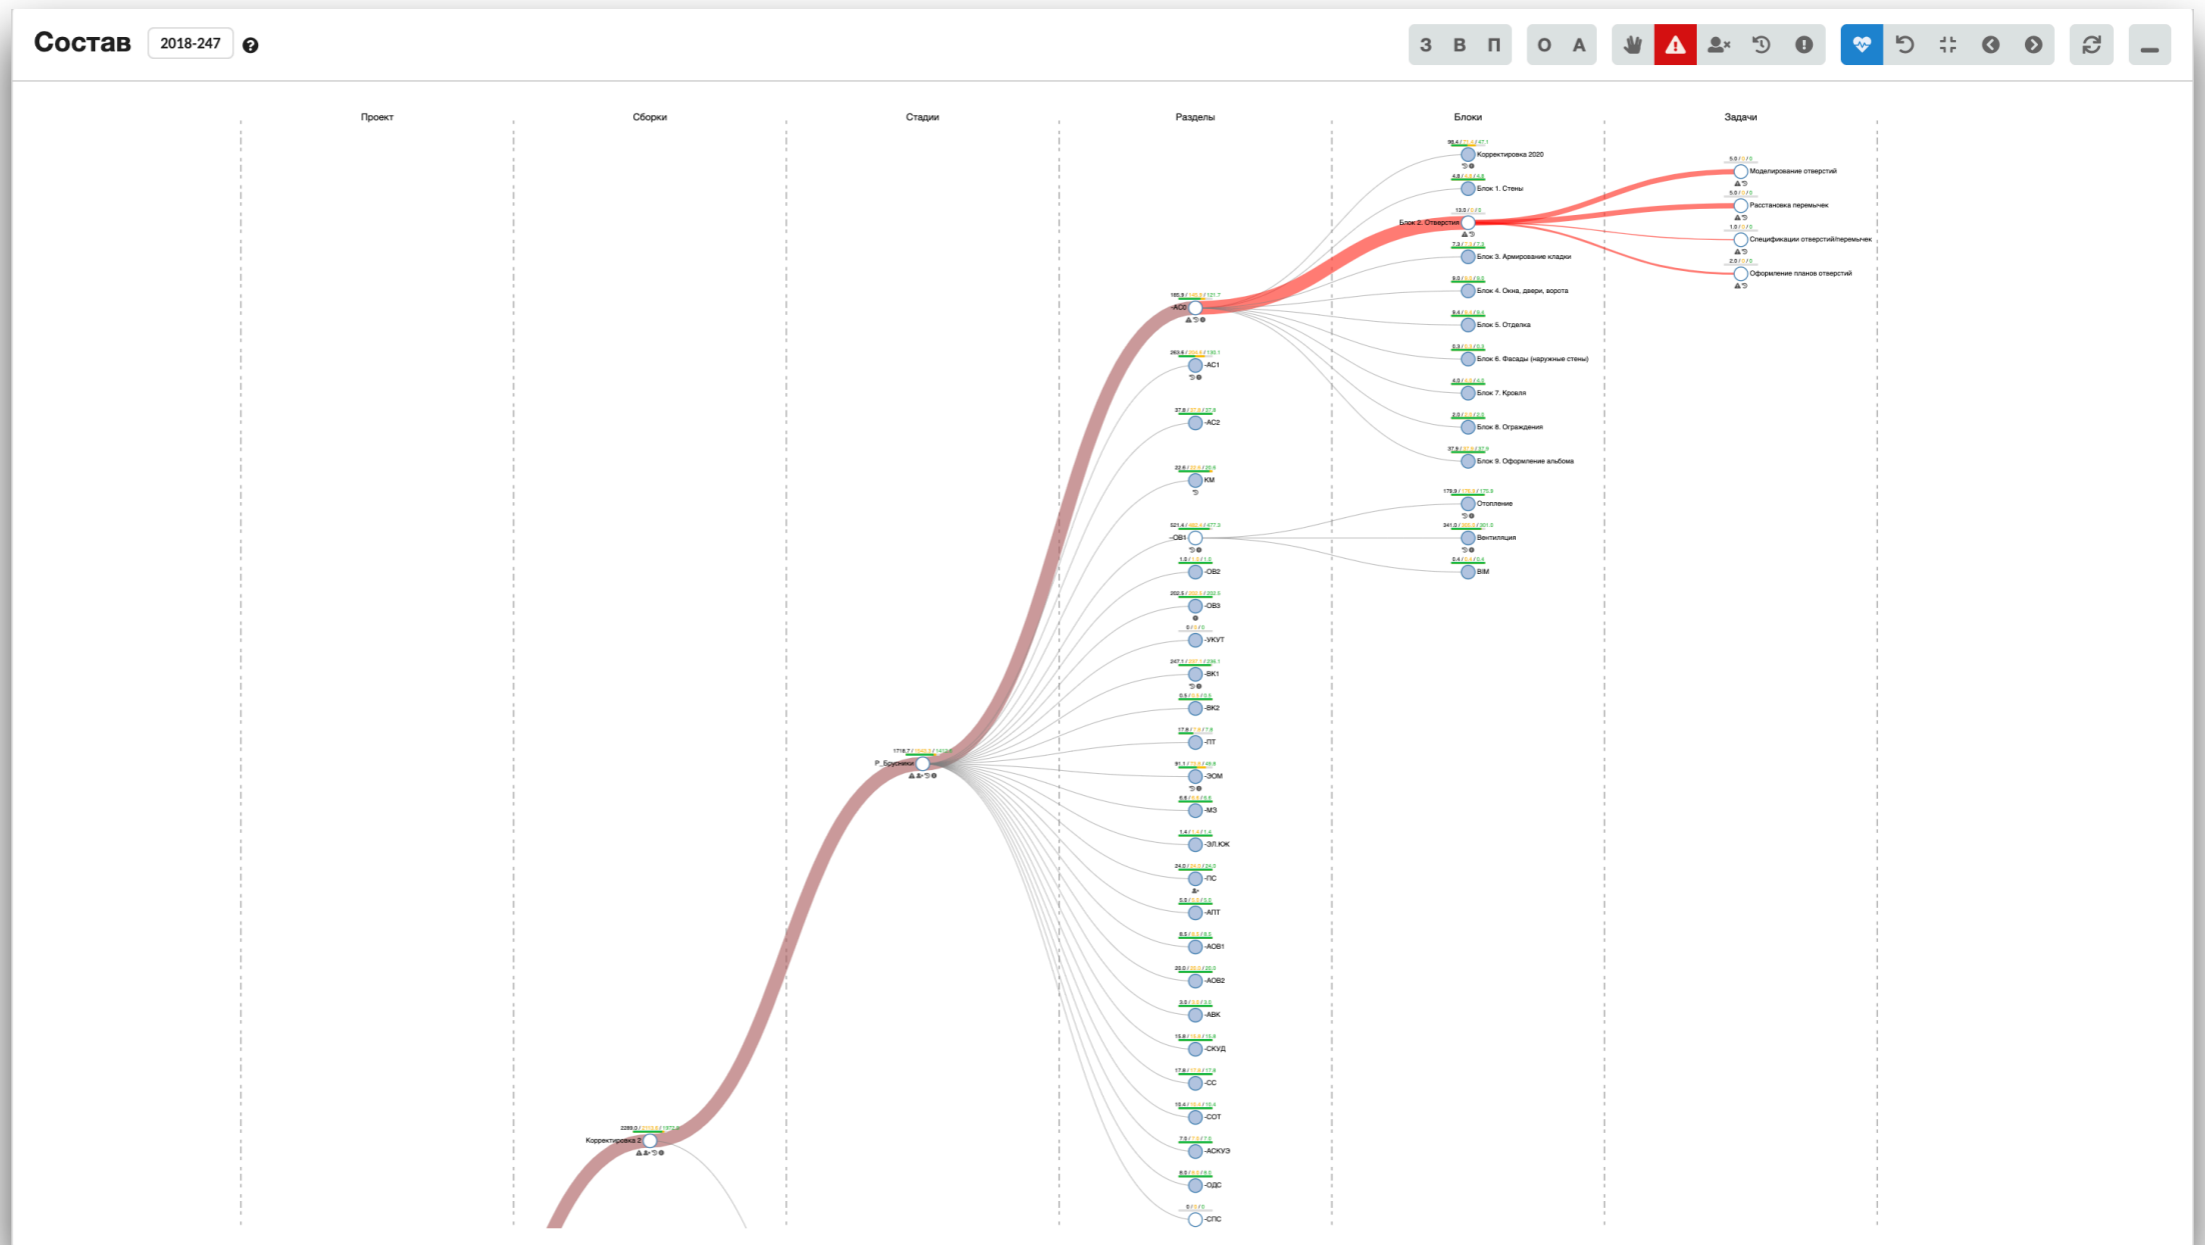

Примечания:

состав – основной инструмент РП для анализа проекта, показывает проблемы в задачах по выданным машиной автостатусам, показывает проблемы в задачах по выданным ВП ручным статусам.

— Загрузка сотрудников в компании (с выполнением)

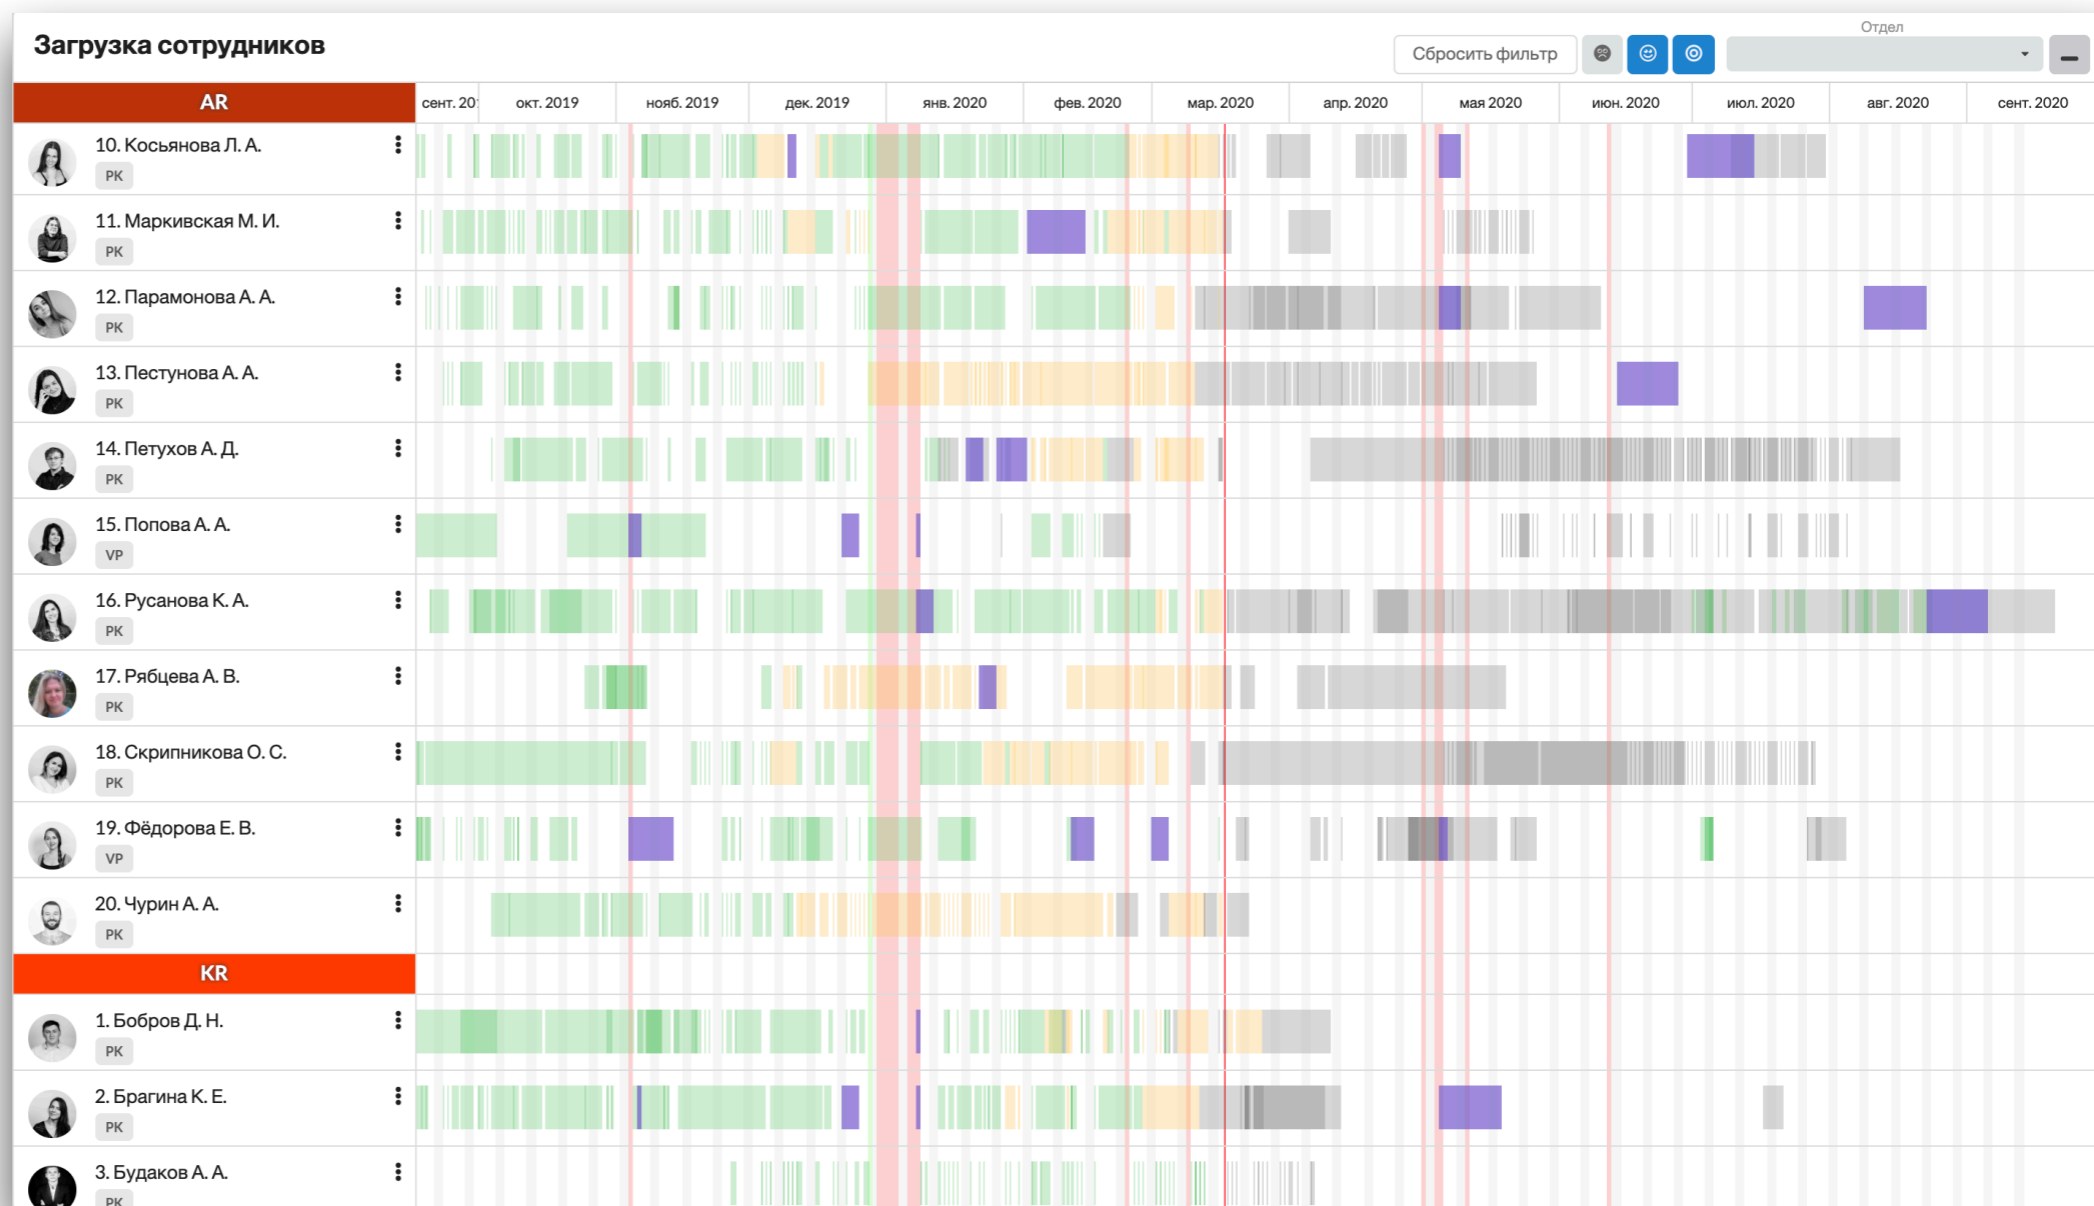

Примечания:


зеленый цвет - запланировано, выполнено, проверено;

желтый - запланировано, выполнено;

серый - запланировано;

фиолетовый - отпуска.

— Сетевое планирование проекта

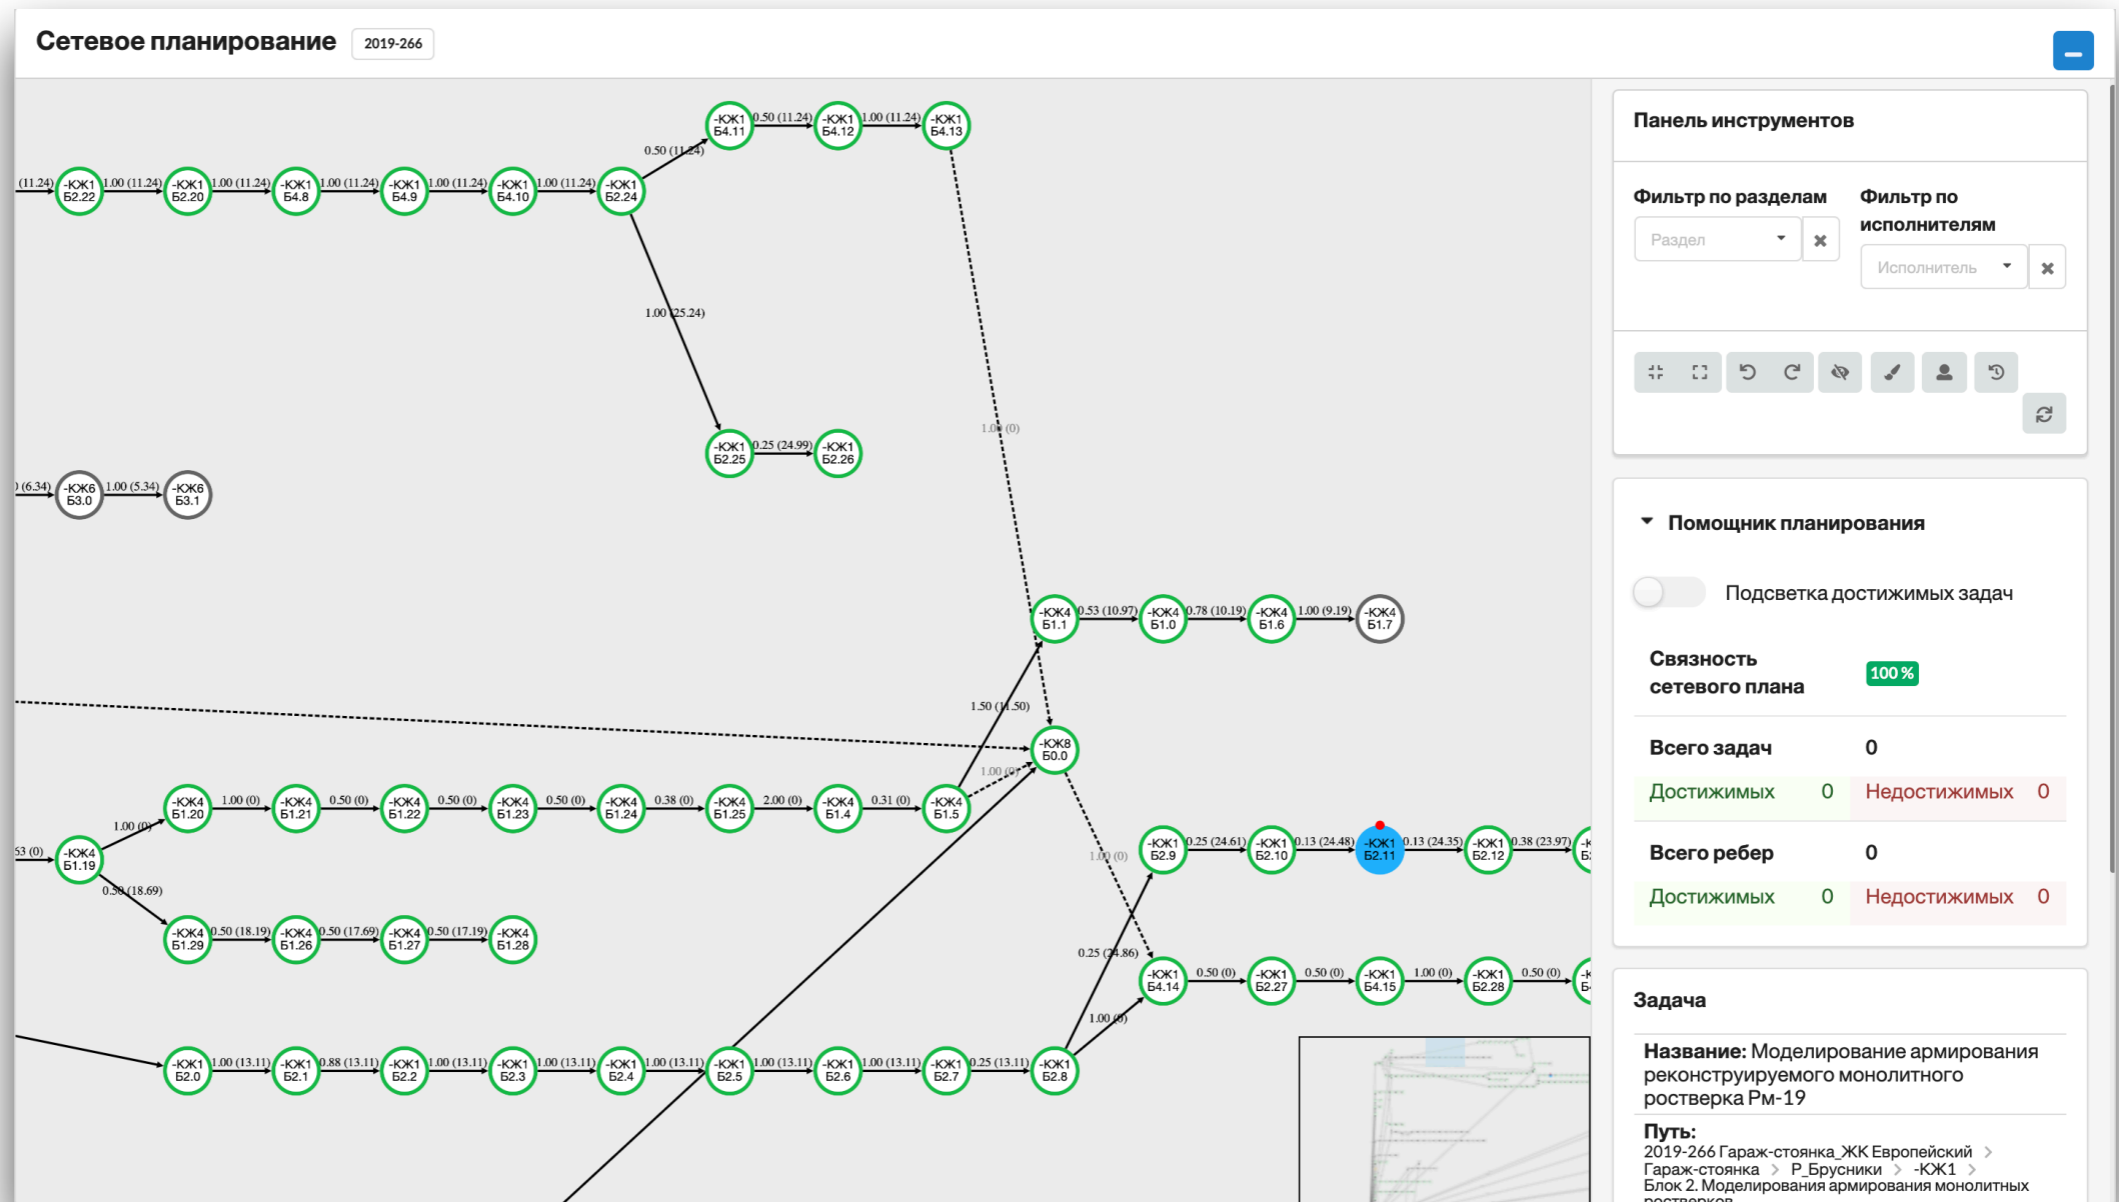

Примечания:
через сетевые планы реализовано автопланирование;
машина сама рассчитывает, кто и когда должен работать;
машина умеет сама подбирать сотрудника на задачу.

— Личный кабинет проектировщика

Задачи
Все задачи сотрудника Фёдорова Е. В.
VP | AR

Проекты
Задачи
HR-Сумматор
Активность
Журнал действий
Депозиты

Исполнитель задачи: -- все --
Поиск: Все Поисковой запрос...
Инструменты: Действия
Масштаб


Задача	Начало	Мар							Апр								
		5	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс
Корректировка в соответствии KI	29.07.2019																
Изменение зивисимости уровня	30.07.2019																
Корректировка дверных проёмов	07.08.2019																
Корректировка лестниц	14.08.2019																
Корректировка стыков стен	14.08.2019																
Корректировка габаритов СУ	16.08.2019																
Оформление подборки норм в Т	08.04.2020																
Разработка спецификации мебели	16.03.2020																
Разработка спецификации паркс	17.03.2020																
Разработка схемы движения авт	18.03.2020																
Разработка поэтажных планов с	26.03.2020																
Оформление ТЧ ПД	09.04.2020																
Сборка и проверка альбома	13.04.2020																
Печать ГЧ в pdf/экспорт в редак	14.04.2020																
Разработка планов со схемой пу	08.04.2020																
Внесение решение по ПБ ПЗУ в	11.04.2020																
Продолжение Создание схем АУ	11.04.2020																
Внесение решение по ПБ АР в ти	13.04.2020																
Внесение решений по электросн	15.04.2020																

Примечания:

ВП видит в личном кабинете свои задачи и задачи своих подчиненных;

ПК в личном кабинете видит только свои задачи.

— Автоматический расчёт дохода сотрудника

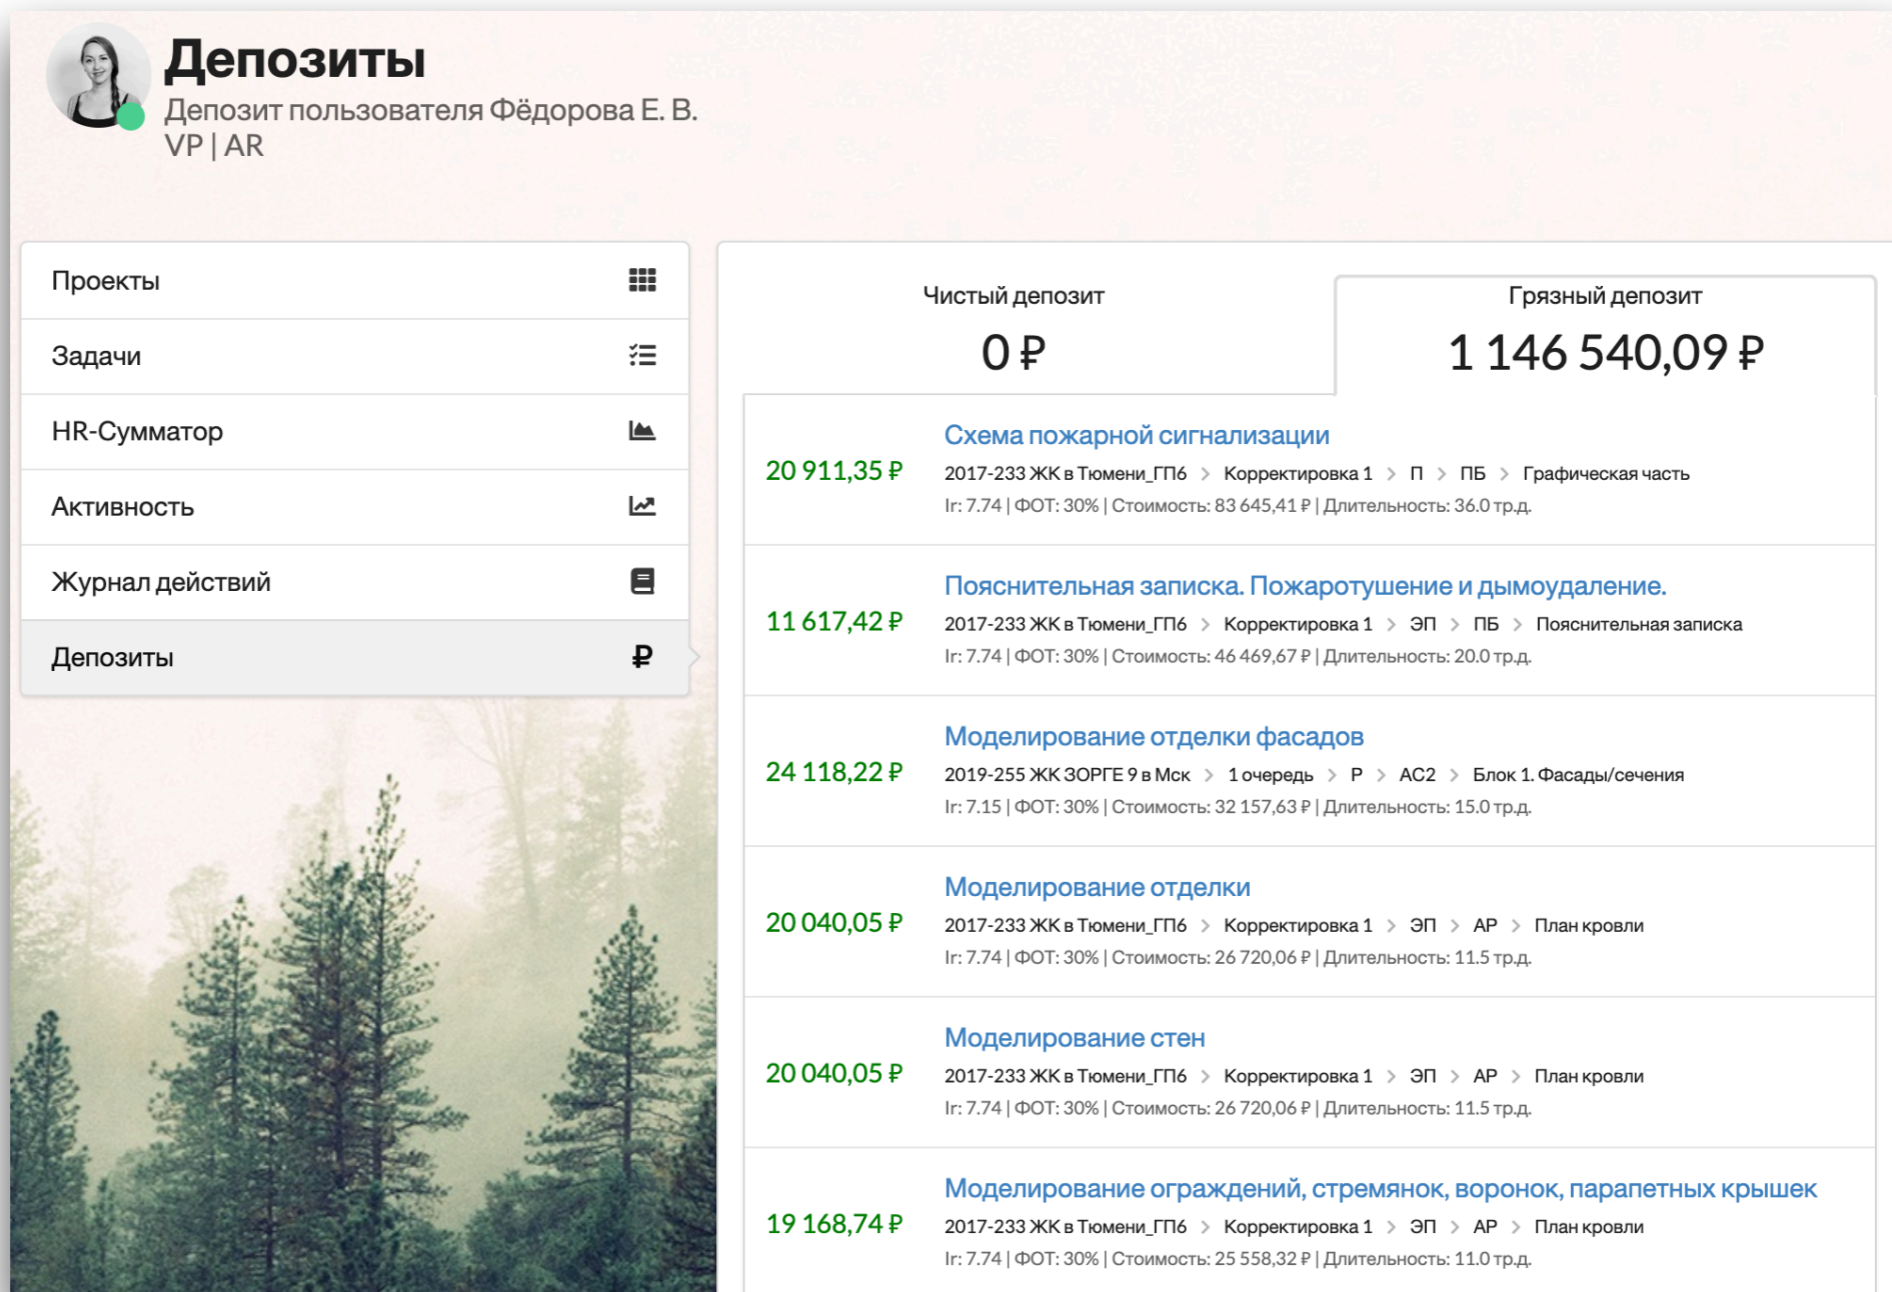

Депозиты
Депозит пользователя Фёдорова Е. В.
VP | AR

Проекты
Задачи
HR-Сумматор
Активность
Журнал действий
Депозиты

Чистый депозит
0 Р

Грязный депозит
1 146 540,09 Р

20 911,35 Р	Схема пожарной сигнализации 2017-233 ЖК в Тюмени_ГП6 > Корректировка 1 > П > ПБ > Графическая часть Iг: 7.74 ФОТ: 30% Стоимость: 83 645,41 Р Длительность: 36.0 тр.д.
11 617,42 Р	Пояснительная записка. Пожаротушение и дымоудаление. 2017-233 ЖК в Тюмени_ГП6 > Корректировка 1 > ЭП > ПБ > Пояснительная записка Iг: 7.74 ФОТ: 30% Стоимость: 46 469,67 Р Длительность: 20.0 тр.д.
24 118,22 Р	Моделирование отделки фасадов 2019-255 ЖК ЗОРГЕ 9 в Мск > 1 очередь > Р > АС2 > Блок 1. Фасады/сечения Iг: 7.15 ФОТ: 30% Стоимость: 32 157,63 Р Длительность: 15.0 тр.д.
20 040,05 Р	Моделирование отделки 2017-233 ЖК в Тюмени_ГП6 > Корректировка 1 > ЭП > АР > План кровли Iг: 7.74 ФОТ: 30% Стоимость: 26 720,06 Р Длительность: 11.5 тр.д.
20 040,05 Р	Моделирование стен 2017-233 ЖК в Тюмени_ГП6 > Корректировка 1 > ЭП > АР > План кровли Iг: 7.74 ФОТ: 30% Стоимость: 26 720,06 Р Длительность: 11.5 тр.д.
19 168,74 Р	Моделирование ограждений, стремянок, воронок, парапетных крышек 2017-233 ЖК в Тюмени_ГП6 > Корректировка 1 > ЭП > АР > План кровли Iг: 7.74 ФОТ: 30% Стоимость: 25 558,32 Р Длительность: 11.0 тр.д.

Примечания:

в Инициаторе реализована эффективная система оплаты труда сотрудников, машина сама умеет рассчитывать доход сотрудника.

Сущности управления проектом. PMBOK 5.0

1. СОДЕРЖАНИЕ	Сбор требований, подтверждение требований, контроль требований к проекту и продукту.
2. СРОКИ	Разработка и контроль расписания проекта.
3. СТОИМОСТЬ	Оценка стоимости, определение бюджета, контроль стоимости проекта.
4. КАЧЕСТВО	Управление качеством проекта - обеспечение соответствия требованиям к проекту, включая требования к продукту, и подтверждение такого соответствия.
5. РЕСУРСЫ	Планирование и контроль ресурсов проекта.
6. КОММУНИКАЦИИ	Обеспечение своевременного и надлежащего сбора, распространения, хранения, получения и архивирования/утилизации проектной информации.
7. ЗАКУПКИ	Управление закупками необходимых для осуществления проекта материалов и услуг.
8. СТОРОНЫ	Планирование контрактации, контрактация и контроль контрактации в проекте.
9. РИСКИ	Идентификация, анализ, разработка сценариев реагирования и контроль рисков в проекте. Риски разрабатываются относительно всех сущностей управления проектом.

ЕИС проектировщика. Инструменты управления. Мониторинг

	Преддоговор	Инициация	Выполнение	Циклы изменений	Закрытие	Анализ
Содержание	G-drive	BIM 360 Docs				
Сроки						
Стоимость	G-tab	ИНЦ				G-tab
Ресурсы						
Качество	G-drive	POWER BI - BIM 360 Docs				
Коммуникации	telegram					
Стороны						
Риски						G-tab
